



## สรุปผลการดำเนินการงานก่อสร้าง

ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ระยะเวลาก่อสร้าง	2382	วัน
ระยะเวลาทำงาน	2352	วัน
ระยะเวลาดังเหลือ	30	
แผนงานสะสมที่ตั้งไว้	92.85	%
ผลงานสะสมที่ทำได้	70.51	%
ผลงานช้ากว่าแผน	-	%

## Summary of the Construction Progress

As of 15 November 2019


Construction Period	2382	Days
Work Period	2352	Days
Remaining Period	30	Days
Planned Work	92.85	%
Current Work	70.51	%
Construction Delay	-	%



โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ พร้อมอาคารประกอบ



โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ พร้อมอาคารประกอบ

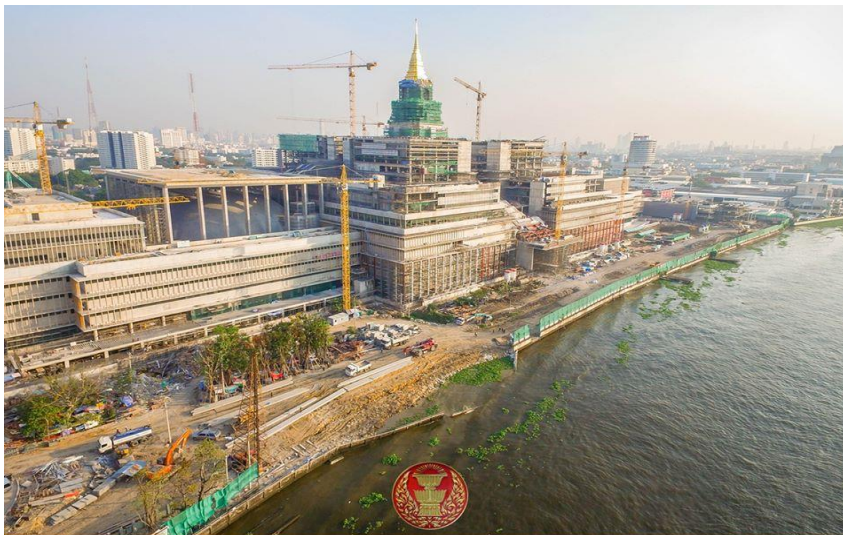

โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ พร้อมอาคารประกอบ
